


Uuenev raamatukogu ehk kuidas remont üle elada

Kristina Pai


Tartu Ülikooli raamatukogu



Otsus alustada remondiga. Ülikool võtab laenu.

Hanked: remondi-, mööbli-, kolimise-, RFID-, tehnika-
jne.


Koos remondiga uueneb ka raamatukogu kontseptsioon,
märksõnadeks AVATUS ja KASUTAJAKESKSUS – suur
avahoidla, palju rühmatööruume, lastetuba, RFID jpm.




Pressiteade 13.05.2016

TÜ raamatukogus alustatakse rekonstrueerimistöödega

AS YIT Ehitus alustab lepingu sõlmimise järgselt rekonstrueerimistöödega, mille käigus uuendatakse nii raamatukogu siseruume kui ka välisosa. Raamatukogu on suletud 23. juunist ligikaudu 4. oktoobrini 2016.

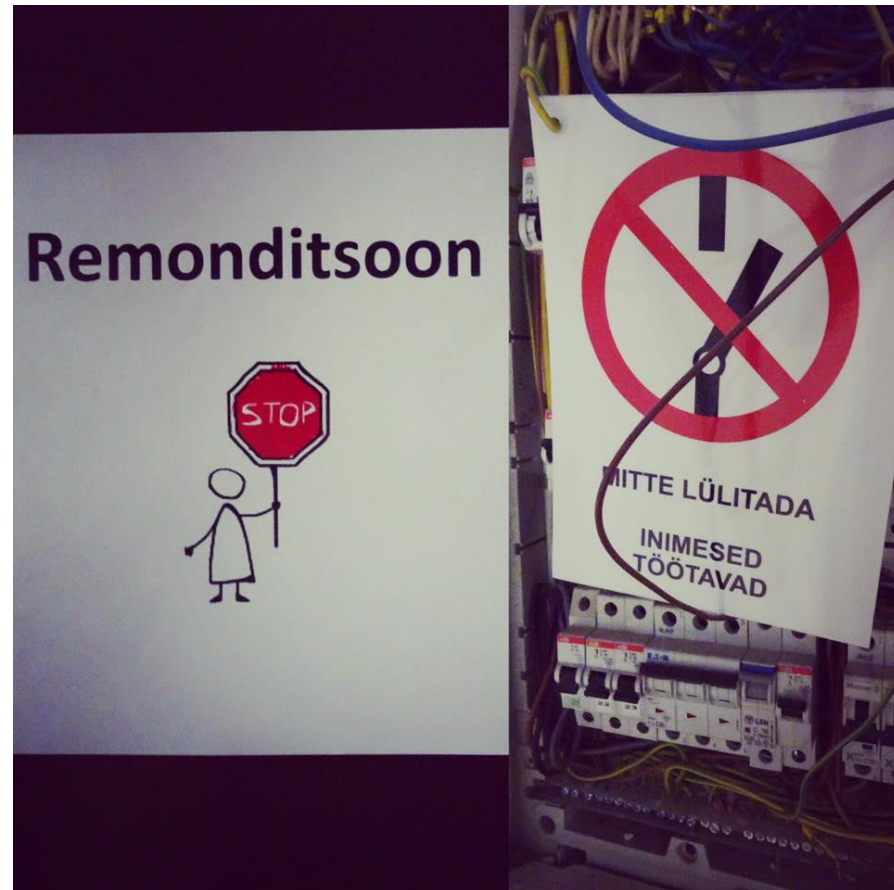



Kogu hoone renoveerimine

Plaan 1

Suur osa kogudest ja mööblist jääb majja, remont etapiviisiline, kestus **~1,5 a.**

Plaan 2

1. ja 2. korrus täielikult tühjendada, et ehitaja saaks kätte suure pinna; vaja hoiupindu kogudele ja mööblile; remondi kestus **~1,5 a**

Plaan 3- tänane seis

kogusid/mööblit/töötajaid paigutame vastavalt vajadusele ümber; remondi kestus **2,5 -...? a.**



REMONT

Läbikäik keelatud



RENOVATION

No thoroughfare!





Kogude pakkimine ja kolimine


I etapp 1. ja 2. korruse (sh 2 hoidlat) vabastamine remondiks

1) KHO kogud kolitakse rk. varjendisse

2) A korruse kogud kolitakse rk. 3. korrusele (0,5 milj) ja hoiupinnale Tartu lähistel (0,5 milj. + läbitöötamata kogud - ~90 euroalust).

II etapp – hoidla B ja C korruse pakkimine ja osa bokside vabastamine remondiks

(Samaaegselt pidi toimuma tagasikolimine I etapi pindadele)



Kogude pakkimine ja kolimine – 3,6 milj.

Hoidlakorrusel 5 boksi a 700 m² = 3500 m²

A korrus - enne remonti



A korrus - remondiks tühjaks kolitud:

0,5 milj lgs korrusele; 0,5 milj hoiupinnal Tartu lähistel






Kogude pakkimine ja kolimine

B korrus – enne remonti



**B korrus - 2 boksi tühjendatud, kastides samal korrusel;
remont bokside kaupa järk-järgult euroaluseid liigutade**





Kogude pakkimine ja kolimine

C korrus – enne remonti (kompaktriulid, tihe paigutus)



**C korrus - 1 boks kolitud tühjaks samale korrusele;
remont bokside kaupa järk-järgult euroaluseid liigutades**



Raamatukogu enne ja nüüd – kasutatav on vaid 1/16 kogudest



lugemissaalid

Hoidlad



KHO hoidla



Läbitöötamata kogud




RAAMATUKOGU

Lugemis-
saalide
korrus



A hoidla



B hoidla



C hoidla



Varjend
(KHO)





LADU Tartu lähistel



Lugemissaalide korrus täis kaste





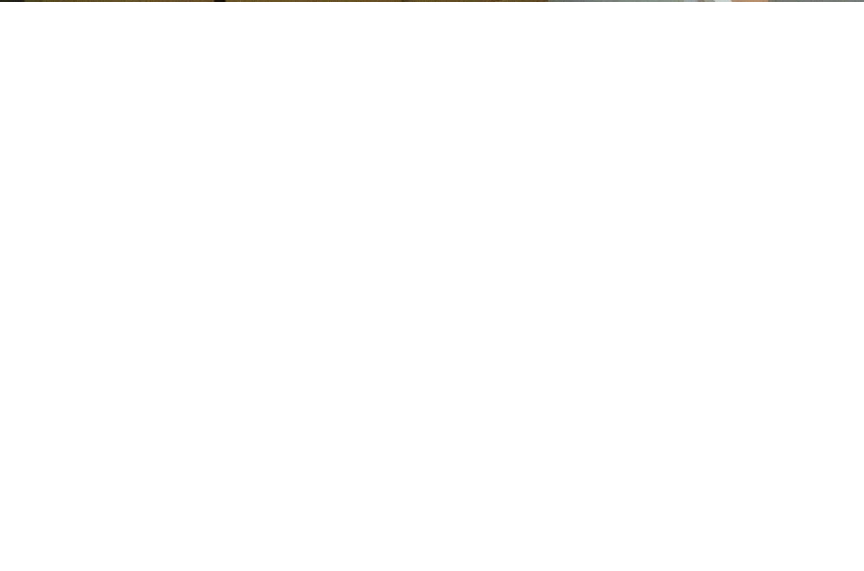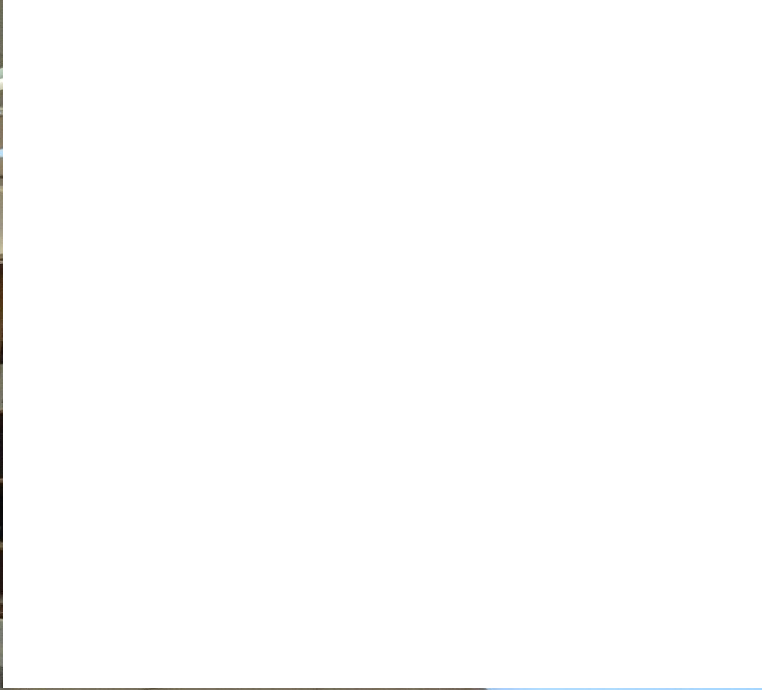



Korralik hoiupind Tartu lähistel
Valve, kütte ja ventilatsiooniga






Väljakolimine

Hoiupind täis kaste








Tööd remondi ajal

Kõik töötajad on kolitud lugemissaalide korrusele.

Jätkub tavapärase komplekteerimine, kataloogimine, ülikooli liikmete nõustamine.

Jätkub mitte-tavapärase teenindus:

- laenutamine-tagastamine tagaukse kaudu,
- Avatud on ajutine (pop-up) raamatukogu Liivi tänaval endises Rahvusarhiivi hoones.
- Erialakogud on olnud meie töötajate abiga kauem lahti.




Pop-up

Arvutid, printer-koopiamasinad; grupitööruumid;
ainepaketid; autoriseeritud töökoht;
ööraamatukogu üritused.






Pop-up



Teenindus võimalikult mugavaks

- Kohalkasutatavaid raamatuid saab koju
- Lugemissaalidest otsivad töötajad raamatu välja
- Pikendada – saab rohkem kordi
- Tellimine mugavam – ka meili/telefoni teel
- Muudatused kodulehel – info vastavusse remondioludega

Tööd remondi ajal - RFID



Oluline uuendus peale remonti – AVAHOIDLA.

1 miljonile raamatule RFID kleebise lisamine,
kirjete korrastamine/loomine.

RFID - kogu maja ühistöö graafikute alusel.

Toimub:

- 1) raamatukogus
- 2) Liivi tn ajutises lugemissaalis
- 3) Laopinnal Tartu lähistel




RFID raamatukogus




RFID laopinnal





Uuenev raamatukogu – uue(nenu)d suhted

- Töötajad paiknevad kõik ühel korrusel
- Naabriks võib olla kolleeg, kellega varem kokku ei puutunud
- Graafikualune töö RFID-ga on inimesi liitnud
- Parim personalikoolitus – külge-külje kõrval töötamine ja remondi/selle venimise/katkemisega hakkamasaamine.
- Rõhk töötajate koolitamisel.
- Mitmed uued tööprotsessid ja ametikohad.



Hetkeseis

Uue hanke ettevalmistamine ja remondiootus.
Lugemissaalide avamine loodetavasti sügisel.

**Ootame teid peagi
uuenenud imeilusas raamatukogus!**



Aitäh!

Kristina.Pai@ut.ee
